



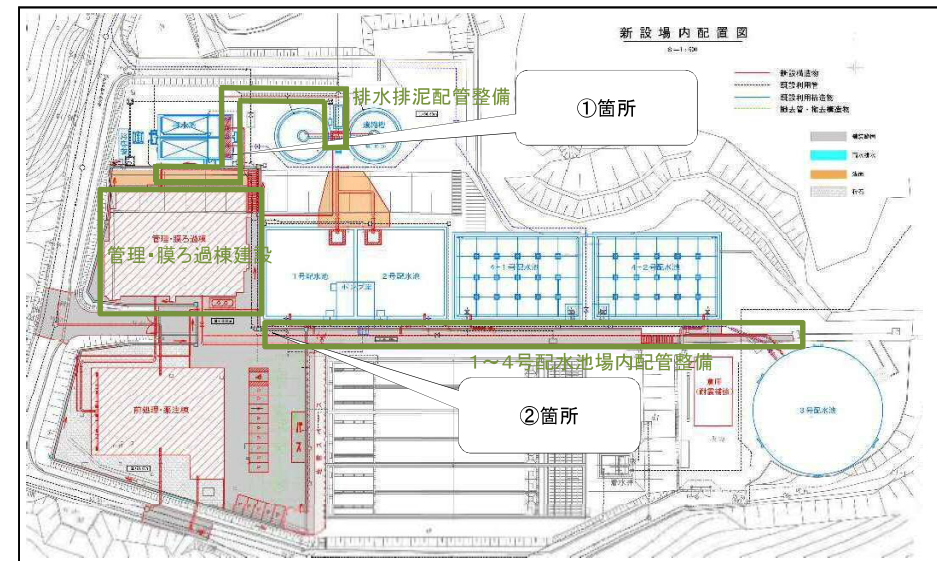

令和7年5月末現在

令和7年度 保呂羽浄水場再構築事業 進捗状況



1. 工事等工程および進捗状況

業務名	工 期	請負業者	委託・請負金額 (税込) (千円)	R5 4 3	R6 4 5 8 12 3	R7 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	R8 4 3	R9 4 3	R10 4 3	R11 4 3
登水請第23001-1号 保呂羽浄水場再構築事業 設計及び建設工事	令和5年4月1日～ 令和12年3月31日	メタウォーター・フジタ・只野組・日本 水工設計 設計・建 設共同企業体	6,763,257 令和7年度事業費 2,008,613	基本設計 詳細設計	仮設棄注 自家発電	排水排泥配管整備・場内配管整 備 薬注棟 撤去	管理・膜ろ過棟構築／仮設監視	前処理・薬注棟構築	膜ろ過運用 (通水開始)	
登水管第23010-4号 保呂羽浄水場再構築事業 保全管理業務	通水開始～ 令和31年1月31日	登米ウォーターサー ビス株式会社	1,470,700							
登水委第23009-2号 保呂羽浄水場再構築事業 設計モニタリング及び建設工事 監理支援業務	令和5年7月10日～ 令和12年3月31日	日水コン・楠山設計 共同企業体	209,000 令和7年度事業費 34,020							

2. 工事状況

今年度は、排水排泥配管の整備と1～4号配水池の場内配管整備及び管理・膜ろ過棟の建設を実施する。

【令和7年5月期の主な工事状況】

- (1) 配水池場内配管の設置の実施と、管路・膜ろ過棟建設予定地の平板載荷試験を実施している。
平板載荷試験の結果、規定の支持力を確保できた。また、土留め壁の捨てコンクリート打設を行った。
※平板載荷試験とは、地盤に載荷板を設置し、荷重を段階的にかけて沈下量を測定することで、地盤の強度や支持力を調べる試験。

①管路・膜ろ過棟建設予定地の平板載荷試験の写真




令和7年5月29日 撮影

②土留め壁捨てコンクリート打設の写真



令和7年5月30日 撮影

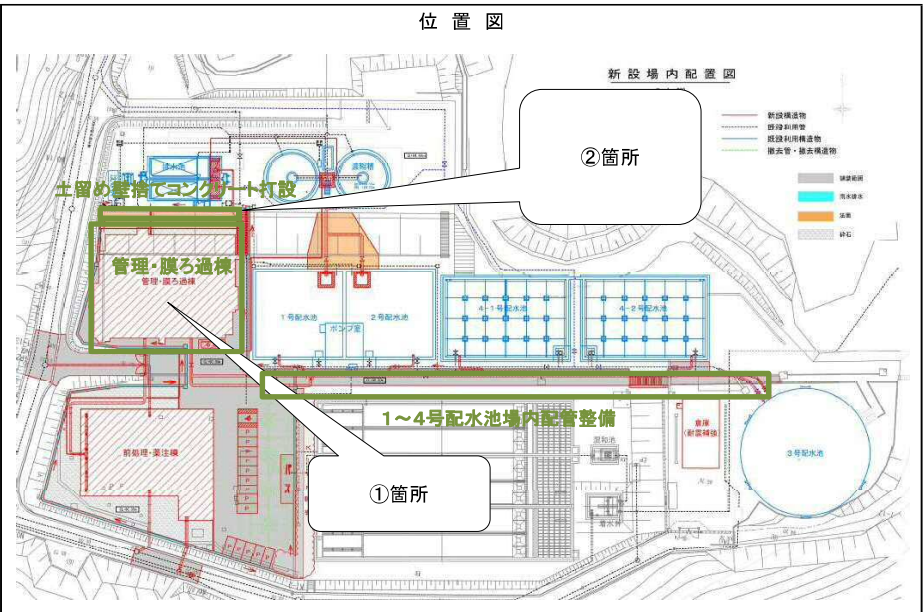

令和 7 年 6 月末現在

令和 7 年度 保呂羽浄水場再構築事業 進捗状況



1. 工事等工程および進捗状況

業務名	工 期	請負業者	委託・請負金額 (税込) (千円)	R5 4 3	R6 4 5 8 12 3	R7 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	R8 4 3	R9 4 3	R10 4 3	R11 4 3
登水請第23001-1号 保呂羽浄水場再構築事業 設計及び建設工事	令和 5 年 4 月 1 日～ 令和12年 3 月31日	メタウォーター・フ ジタ・只野組・日本 水工設計・設計・建 設共同企業体	6,763,257 令和7年度事業費 2,008,613	基本設計 詳細設計	仮設棄注 自家発電 薬注線 撤去	排水排泥配管整備・場内配管整			前処理・薬注棟構築	膜ろ過運用 (通水開始)
登水管第23010-4号 保呂羽浄水場再構築事業 保安全管理業務	通水開始～ 令和31年 1 月31日	登米ウォーターサー ビス株式会社	1,470,700							
登水委第23009-2号 保呂羽浄水場再構築事業 設計モニタリング及び建設工事 監理支援業務	令和 5 年 7 月10日～ 令和12年 3 月31日	日水コン・楠山設計 共同企業体	209,000 令和7年度事業費 34,020							

2. 工事状況

今年度は、排水排泥配管の整備と1～4号配水池の場内配管整備及び管理・膜ろ過棟の建設を実施する。

【令和 7 年 6 月期の主な工事状況】

(1) 3号配水池の配管切替及び草飼山送水管の配管切替と、管路・膜ろ過棟の底板鉄筋の組立を実施している。

①草飼山送水管切替の写真



令和 7 年 6 月 3 0 日 撮影

②管理・膜ろ過棟底板鉄筋組立の写真



令和 7 年 6 月 2 7 日 撮影

