

令和7年7月末現在

令和7年度 保呂羽浄水場再構築事業 進捗状況



1. 工事等工程および進捗状況

業務名	工期	請負業者	委託・請負金額 (税込) (千円)	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
登水請第23001-1号 保呂羽浄水場再構築事業 設計及び建設工事	令和5年4月1日～ 令和12年3月31日	メタウォーター・フジタ・只野組・日本 水工設計 設計・建 設共同企業体	6,763,257 令和7年度事業費 2,008,613	基本設計 詳細設計	自家発電	仮設棄注 棄注棟 撤去	排水排泥配管整備・場内配管整	管理・膜ろ過棟構築／仮設監視	前処理・薬注棟構築	膜ろ過運用 (通水開始?)
登水管第23010-4号 保呂羽浄水場再構築事業 保全管理業務	通水開始～ 令和31年1月31日	登米ウォーターサー ビス株式会社	1,470,700							
登水委第23009-2号 保呂羽浄水場再構築事業 設計モニタリング及び建設工事 監理支援業務	令和5年7月10日～ 令和12年3月31日	日水コン・楠山設計 共同企業体	209,000 令和7年度事業費 34,020							

2. 工事状況

今年度は、排水排泥配管の整備と1～4号配水池の場内配管整備及び管理・膜ろ過棟の建設を実施する。

【令和7年7月期の主な工事状況】

(1) 管理・膜ろ過棟の基礎コンクリートの打設と、濃縮槽流入管の設置を実施している。

①管理・膜ろ過棟の基礎コンクリート打設の写真




令和7年7月24日 撮影

②濃縮槽流入管設置の写真



令和7年7月20日 撮影

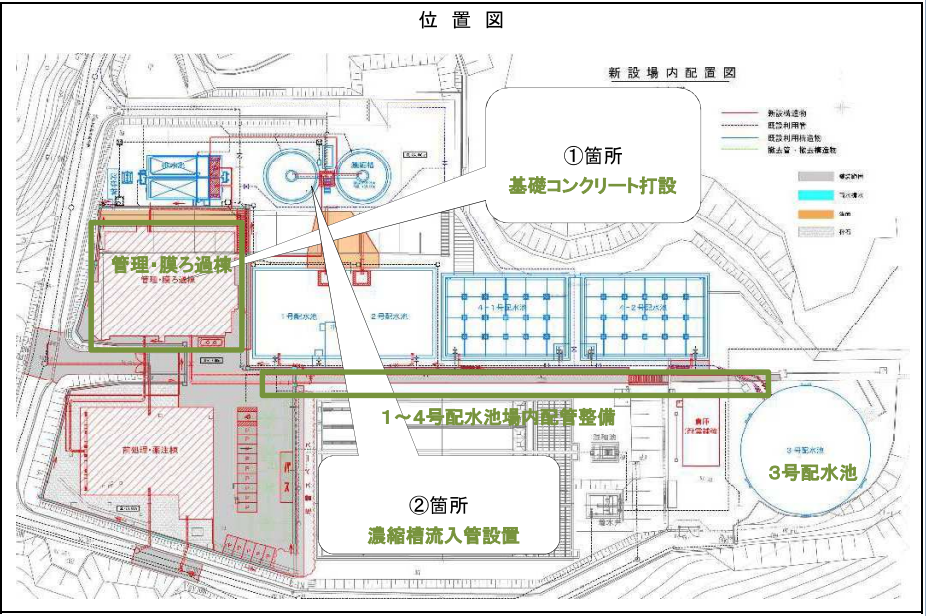

令和7年度 保呂羽浄水場再構築事業 進捗状況



業務名	工 期	請負業者	委託・請負金額 (税込) (千円)	R5 4 3	R6 4 5 8 12 3	R7 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	R8 4 3	R9 4 3	R10 4 3	R11 4 3
登水請第23001-1号 保呂羽浄水場再構築事業 設計及び建設工事	令和5年4月1日～ 令和12年3月31日	メタウォーター・フ ジタ・只野組・日本 水工設計 設計・建 設共同企業体	6,763,257 令和7年度事業費 2,008,613	基本設計 詳細設計	自家発電	仮設薬注 薬注棟撤去	排水排泥配管整備・場内配管整	管理・膜石過換構築／仮設監視	前処理・薬注棟構築	膜石過運用 (通水開始)
登水管第23010-4号 保呂羽浄水場再構築事業 保全管理業務	通水開始～ 令和31年1月31日	登米ウォーターサー ビス株式会社	1,470,700							
登水委第23009-2号 保呂羽浄水場再構築事業 設計モニタリング及び建設工事 監理支援業務	令和5年7月10日～ 令和12年3月31日	日水コン・楠山設計 共同企業体	209,000 令和7年度事業費 34,020							

位置図

新設場内配置図

①箇所
基礎コンクリート打設

管理・換ろ過棟
管理・換ろ過棟

1号配水池
2号配水池
4号配水池
4号配水池

1～4号配水池場内配管整備

②箇所
濃縮槽流入管設置

3号配水池
3号配水池

新設構造物
既設利用増設
既設利用廃止
撤去量・撤去標準量

0m 10m 20m

令和 7 年 9 月末現在

令和 7 年度 保呂羽浄水場再構築事業 進捗状況



1. 工事等工程および進捗状況

業務名	工 期	請負業者	委託・請負金額 (税込) (千円)	R5 4	R6 3	R6 4	R6 5	R6 8	R6 12	R6 3	R7 4	R7 5	R7 6	R7 7	R7 8	R7 9	R7 10	R7 11	R7 12	R7 1	R7 2	R7 3	R8 4	R8 3	R9 4	R9 3	R10 4	R10 3	R11 4	R11 3
登水請第23001-1号 保呂羽浄水場再構築事業 設計及び建設工事	令和 5 年 4 月 1 日～ 令和12年 3 月31日	メタウォーター・フ ジタ・只野組・日本 水工設計 設計・建 設共同企業体	6,763,257 令和7年度事業費 2,008,613	基本設計 詳細設計				自家発電	仮設薬 注																					
登水管第23010-4号 保呂羽浄水場再構築事業 保全管理業務	通水開始～ 令和31年 1 月31日	登米ウォーターサー ビス株式会社	1,470,700																											
登水委第23009-2号 保呂羽浄水場再構築事業 設計モニタリング及び建設工事 監理支援業務	令和 5 年 7 月10日～ 令和12年 3 月31日	日水コン・楠山設計 共同企業体	209,000 令和7年度事業費 34,020																											

2. 工事状況

今年度は、排水排泥配管の整備と1～4号配水池の場内配管整備及び管理・膜ろ過棟の建設を実施する。

【令和 7 年 9 月期の主な工事状況】

(1) 管理・膜ろ過棟 1 階コンクリートの打設及び型枠支保工組立と、管理・膜ろ過棟エントランス階段の施工を 実施している。

①管理・膜ろ過棟の1階コンクリート打設及び型
枠支保工組立の写真



令和 7 年 9 月 2 9 日 撮影

②管理・膜ろ過棟エントランス階段の施工写真



令和 7 年 9 月 3 0 日 撮影

