


令和6年度 保呂羽浄水場再構築事業 進捗状況



1. 工事等工程および進捗状況

業務名	工期	請負業者	委託・請負金額 (税込) (千円)	R5			R6			R7			R8			R9			R10			R11					
				4	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4
登水請第23001-1号 保呂羽浄水場再構築事業 設計及び建設工事	令和5年4月1日～ 令和12年3月31日	メタウォーター・フジタ・只野組・日本 水工設計 設計・建設 共同企業体	6,547,200 令和6年度事業費 578,753																								
登水管第23010-4号 保呂羽浄水場再構築事業 保全管理業務	通水開始～ 令和31年1月31日	登米ウォーターサー ビス株式会社	1,470,700																								
登水委第23009-2号 保呂羽浄水場再構築事業 設計モニタリング及び建設工事監 理支援業務	令和5年7月10日～ 令和12年3月31日	日水コン・楠山設計 共同企業体	209,000 令和6年度事業費 34,020																								

2. 工事状況

基本設計を基に、各種調査を行いながら詳細設計を令和6年5月に完了した。現在、詳細設計の内容照査が完了している。

今年度は1・2号配水池場内配管整備、自家発電設備撤去、配水排水配管改造、仮設薬注設備整備及び薬品処理棟撤去工事を実施する。

【令和6年7月期の主な工事状況】

(1) 仮設薬注設備設置のため、既存の自家発電設備を撤去した。

① 既存自家発電設備撤去中の写真




令和6年7月8日 撮影


② 既存自家発電設備撤去後の写真



令和6年7月26日 撮影

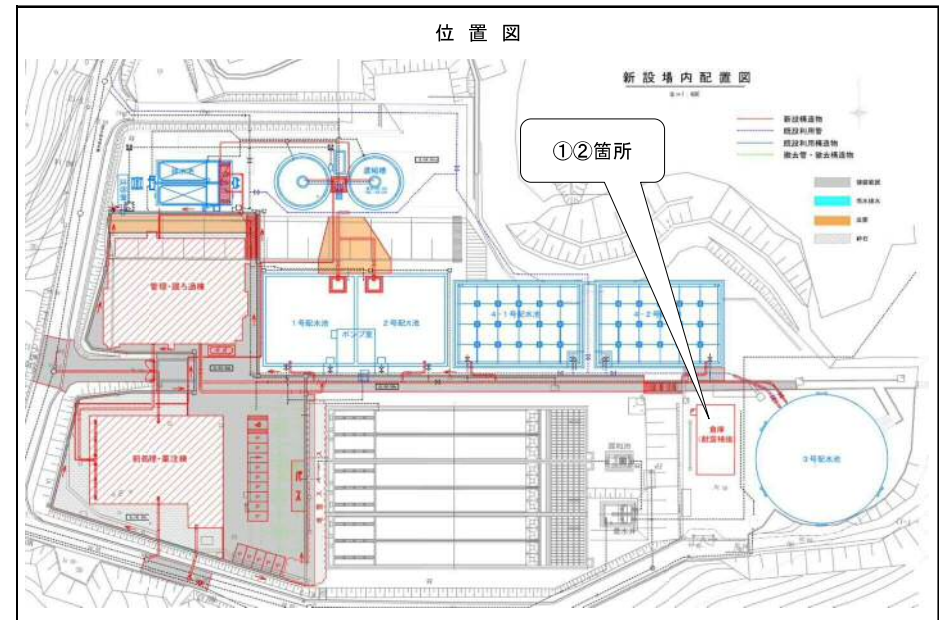

令和6年度 保呂羽浄水場再構築事業 進捗状況



1. 工事等工程および進捗状況

業務名	工期	請負業者	委託・請負金額 (税込) (千円)	R5				R6				R7				R8				R9				R10				R11			
				4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1
登水請第23001-1号 保呂羽浄水場再構築事業 設計及び建設工事	令和5年4月1日～ 令和12年3月31日	メタウォーター・フジタ・只野組・日本 水工設計 設計・建 設共同企業体	6,547,200 令和6年度事業費 578,753																												
登水管第23010-4号 保呂羽浄水場再構築事業 保全管理業務	通水開始～ 令和31年1月31日	登米ウォーターサー ビス株式会社	1,470,700																												
登水委第23009-2号 保呂羽浄水場再構築事業 設計モニタリング及び建設工事監 理支援業務	令和5年7月10日～ 令和12年3月31日	日水コン・楠山設計 共同企業体	209,000 令和6年度事業費 34,020																												

2. 工事状況

基本設計を基に、各種調査を行いながら詳細設計が令和6年5月に完了した。また、その内容照査についても完了した。

今年度は1・2号配水池場内配管整備、自家発電設備撤去、配水排泥配管改造、仮設薬注設備整備及び薬品処理棟撤去工事を実施する。

【令和6年8月期の主な工事状況】

(1) 既設薬注棟撤去のため、仮設薬注設備配管工事及び、自家発電棟床改修工事を実施した。

①仮設薬注設備の配管工事の写真




令和6年8月23日 撮影


②自家発電棟床改修工事の写真



令和6年8月28日 撮影

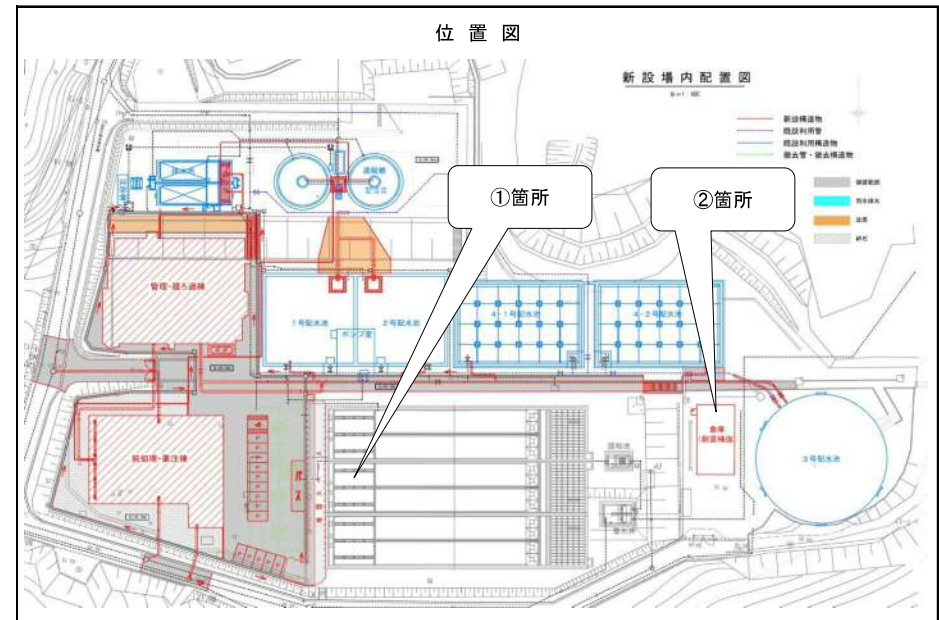

令和6年度 保呂羽浄水場再構築事業 進捗状況



1. 工事等工程および進捗状況

業務名	工期	請負業者	委託・請負金額 (税込) (千円)	R5			R6			R7			R8			R9			R10			R11					
				4	3	2	4	3	2	4	3	2	4	3	2	4	3	2	4	3	2	4	3	2			
登水請第23001-1号 保呂羽浄水場再構築事業 設計及び建設工事	令和5年4月1日～ 令和12年3月31日	メタウォーター・フジタ・只野組・日本 水工設計 設計・建 設共同企業体	6,547,200 令和6年度事業費 578,753				基本設計 詳細設計			自家発電設備 撤去			仮設薬注設備 設置			管理・膜ろ過棟構築/仮設監視						前処理・薬注棟構築			膜ろ過運用 (通水開始)		
登水管第23010-4号 保呂羽浄水場再構築事業 保全管理業務	通水開始～ 令和31年1月31日	登米ウォーターサー ビス株式会社	1,470,700																								
登水委第23009-2号 保呂羽浄水場再構築事業 設計モニタリング及び建設工事監 理支援業務	令和5年7月10日～ 令和12年3月31日	日水コン・楠山設計 共同企業体	209,000 令和6年度事業費 34,020																								

2. 工事状況

基本設計を基に、各種調査を行いながら詳細設計が令和6年5月に完了した。また、その内容照査についても完了した。

今年度は仮設薬注設備整備及び薬品処理棟撤去工事、自家発電設備撤去、1・2号配水池場内配管整備、配水排泥配管改造を実施する。

【令和6年9月期の主な工事状況】

(1) 仮設薬注設備整備のため、既設自家発電棟の耐震補強および床改修工事を実施した。

①自家発電棟耐震補強工事 (完成写真)



令和6年9月19日 撮影

②自家発電棟床改修工事 (完成写真)



令和6年9月26日 撮影

