


令和6年度 保呂羽浄水場再構築事業 進捗状況



1. 工事等工程および進捗状況

業務名	工期	請負業者	委託・請負金額 (税込) (千円)	R5				R6				R7				R8			R9			R10			R11		
				4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	4	3	2	4	3	2	4	3	2
登水請第23001-1号 保呂羽浄水場再構築事業 設計及び建設工事	令和5年4月1日～ 令和12年3月31日	メタウォーター・フジタ・只野組・日本 水工設計 設計・建 設共同企業体	6,547,200 令和6年度事業費 578,753	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
登水管第23010-4号 保呂羽浄水場再構築事業 保全管理業務	通水開始～ 令和31年1月31日	登米ウォーターサー ビス株式会社	1,470,700																								
登水委第23009-2号 保呂羽浄水場再構築事業 設計モニタリング及び建設工事監 理支援業務	令和5年7月10日～ 令和12年3月31日	日水コン・楠山設計 共同企業体	209,000 令和6年度事業費 34,020	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←

2. 工事状況

基本設計を基に、各種調査を行いながら詳細設計が令和6年5月に完了した。また、その内容照査についても完了した。

今年度は自家発電設備撤去、仮設薬注設備整備及び薬注棟撤去工事、1・2号配水池場内配管整備、配水排泥配管改造を実施する。

【令和6年10月期の主な工事状況】

- (1) 仮設薬注設備のPAC貯留槽設置工事及び電気盤設置工事を実施した。

①PAC貯留槽設置状況写真




令和6年10月21日 撮影


②電気盤設置状況写真



令和6年10月28日 撮影

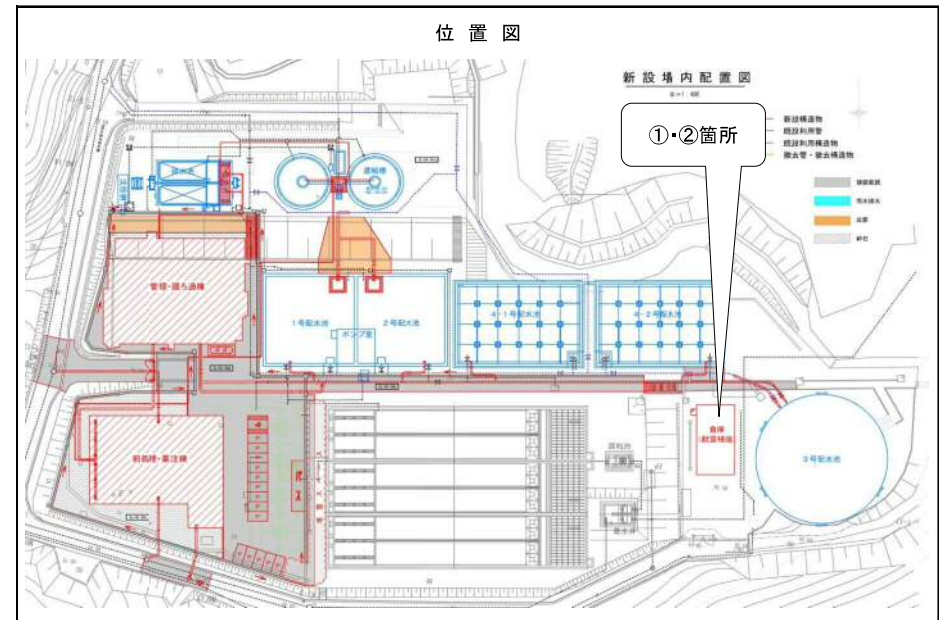

令和6年度 保呂羽浄水場再構築事業 進捗状況



1. 工事等工程および進捗状況

業務名	工期	請負業者	委託・請負金額 (税込) (千円)	R5			R6			R7			R8			R9			R10			R11		
				4	3	2	4	5	6	4	5	6	4	3	2	4	3	2	4	3	2	4	3	2
登水請第23001-1号 保呂羽浄水場再構築事業 設計及び建設工事	令和5年4月1日～ 令和12年3月31日	メタウォーター・フジタ・只野組・日本 水工設計 設計・建 設共同企業体	6,547,200 令和6年度事業費 578,753																					
登水管第23010-4号 保呂羽浄水場再構築事業 保全管理業務	通水開始～ 令和31年1月31日	登米ウォーターサー ビス株式会社	1,470,700																					
登水委第23009-2号 保呂羽浄水場再構築事業 設計モニタリング及び建設工事監 理支援業務	令和5年7月10日～ 令和12年3月31日	日水コン・楠山設計 共同企業体	209,000 令和6年度事業費 34,020																					

2. 工事状況

基本設計を基に、各種調査を行いながら詳細設計が令和6年5月に完了した。また、その内容照査についても完了した。

今年度は自家発電設備撤去、仮設薬注設備整備及び薬注棟撤去工事、1・2号配水池場内配管整備、配水排泥配管改造を実施する。

【令和6年11月期の主な工事状況】

(1) 既設薬注棟を撤去し新しい管理・膜ろ過棟を建築するため、既設自家発電棟に設置した仮設薬注設備の据付確認及び試験運転を実施した。

①仮設薬注設備の据付確認状況写真



令和6年11月14日 撮影

②仮設薬注設備の試験運転状況写真



令和6年11月18日 撮影

