


令和7年度 保呂羽浄水場再構築事業 進捗状況



1. 工事等工程および進捗状況


業務名	工期	請負業者	委託・請負金額 (税込) (千円)	R5		R6				R7							R8		R9		R10		R11				
				4	3	4	5	8	12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	3	4	3	4
登水請第23001-1号 保呂羽浄水場再構築事業 設計及び建設工事	令和5年4月1日～ 令和12年3月31日	メタウォーター・フジタ・只野組・日本 水工設計 設計・建 設共同企業体	6,763,257 令和7年度事業費 2,008,613	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
登水管第23010-4号 保呂羽浄水場再構築事業 保全管理業務	通水開始～ 令和31年1月31日	登米ウォーターサー ビス株式会社	1,470,700																								
登水委第23009-2号 保呂羽浄水場再構築事業 設計モニタリング及び建設工事 監理支援業務	令和5年7月10日～ 令和12年3月31日	日水コン・楠山設計 共同企業体	209,000 令和7年度事業費 34,020	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←

2. 工事状況

今年度は、排水排泥配管の整備と1～4号配水池の場内配管整備及び管理・膜ろ過棟の建設を実施する。

【令和8年2月期の主な工事状況】

(1) 管理・膜ろ過棟4階床打設と1号・2号配水池清流壁のコア抜きを実施している。

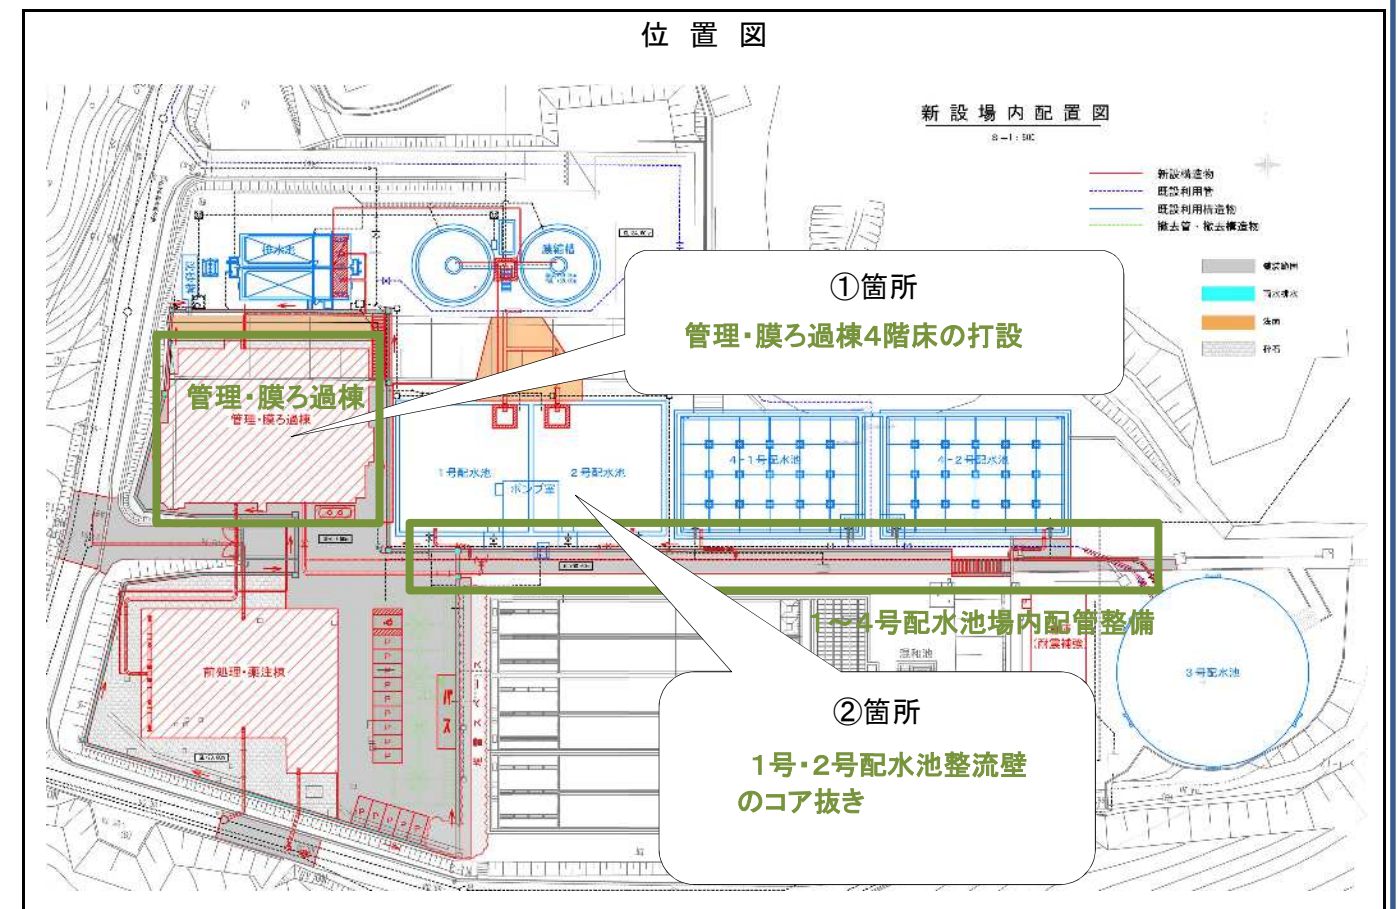

① 管理・膜ろ過棟4階床打設の状況



令和8年2月25日 撮影

② 2号配水池整流壁のコア抜き状況



令和8年2月25日 撮影
