令和６年10月末現在

令和６年度　保呂羽浄水場再構築事業　進捗状況

凡例
計画
実績

1. 工事等工程および進捗状況

業務名	工　期	請負業者	委託・請負金額（税込）（千円）
登水請第23001-1号 保呂羽浄水場再構築事業 設計及び建設工事	令和５年４月１日～ 令和12年３月31日	メタウォーター・フジタ・只野組・日本水工設計　設計・建設共同企業体	6,547,200 令和6年度事業費 578,753
登水管第23010-4号 保呂羽浄水場再構築事業 保全管理業務	通水開始～ 令和31年１月31日	登米ウォーターサービス株式会社	1,470,700
登水委第23009-2号 保呂羽浄水場再構築事業 設計モニタリング及び建設工事監理支援業務	令和５年７月10日～ 令和12年３月31日	日水コン・楠山設計共同企業体	209,000 令和6年度事業費 34,020

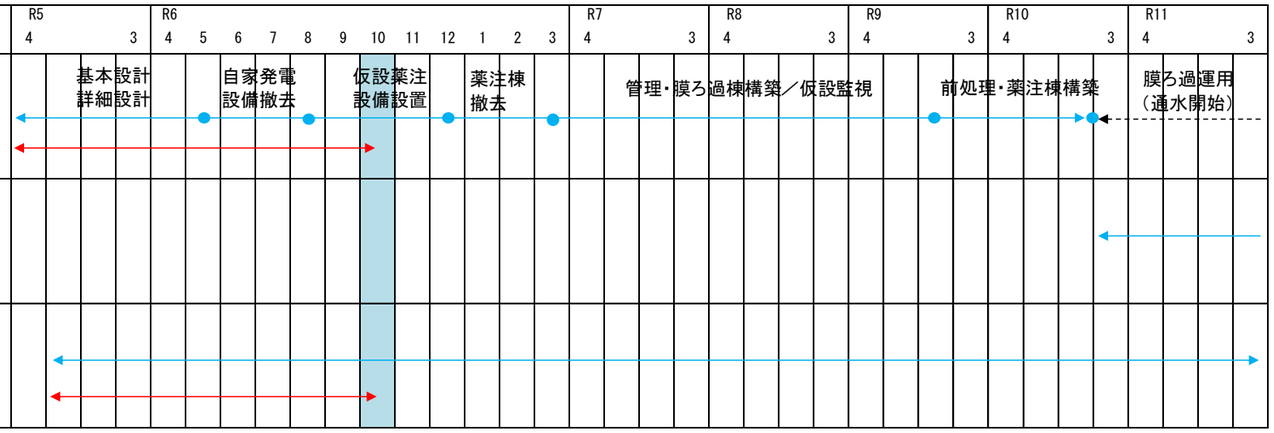

2. 工事状況

基本設計を基に、各種調査を行いながら詳細設計が令和６年５月に完了した。また、その内容照査についても完了した。

今年度は自家発電設備撤去、仮設薬注設備整備及び薬注棟撤去工事、1･2号配水池場内配管整備、配水排泥配管改造を実施する。

【令和６年10月期の主な工事状況】

（１）仮設薬注設備のPAC貯留槽設置工事及び電気盤設置工事を実施した。

①PAC貯留槽設置状況写真

令和6年10月21日　撮影

②電気盤設置状況写真

令和6年10月28日　撮影
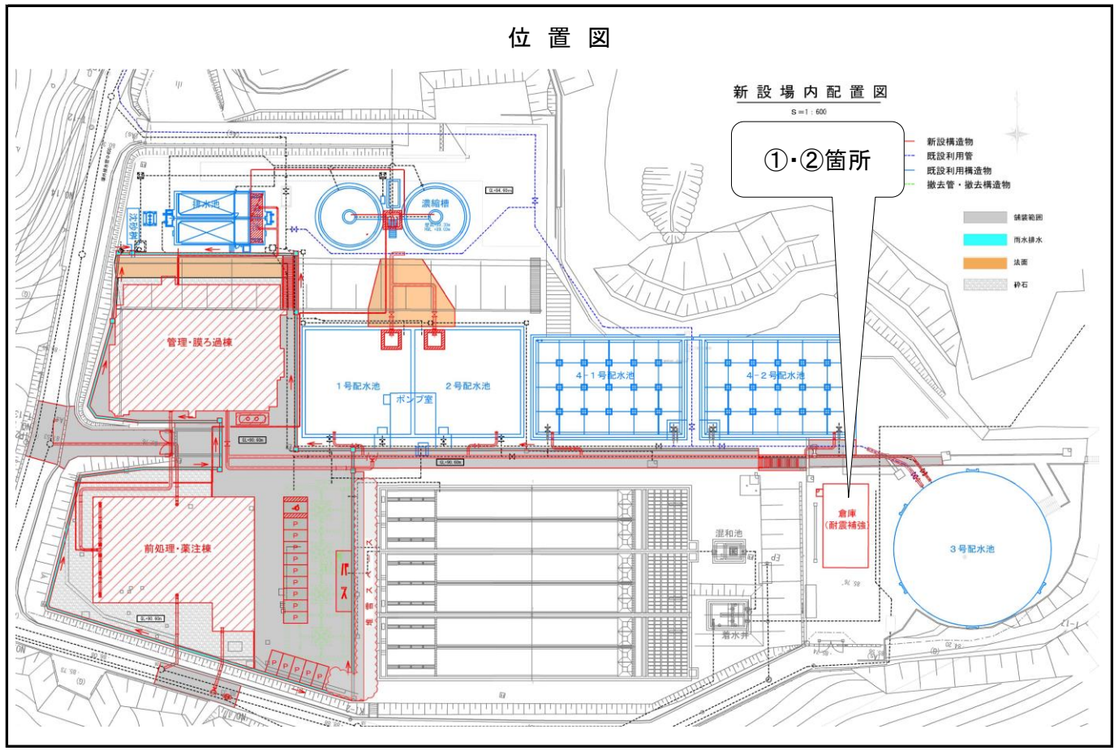
位　置　図
