令和７年１月末現在

令和６年度　保呂羽浄水場再構築事業　進捗状況

凡例
計画
実績

1. 工事等工程および進捗状況

業務名	工　期	請負業者	委託・請負金額（税込）（千円）
登水請第23001-1号 保呂羽浄水場再構築事業 設計及び建設工事	令和５年４月１日～ 令和12年３月31日	メタウォーター・フジタ・只野組・日本水工設計　設計・建設共同企業体	6,547,200 令和6年度事業費 578,753
登水管第23010-4号 保呂羽浄水場再構築事業 保全管理業務	通水開始～ 令和31年１月31日	登米ウォーターサービス株式会社	1,470,700
登水委第23009-2号 保呂羽浄水場再構築事業 設計モニタリング及び建設工事監理支援業務	令和５年７月10日～ 令和12年３月31日	日水コン・楠山設計共同企業体	209,000 令和6年度事業費 34,020

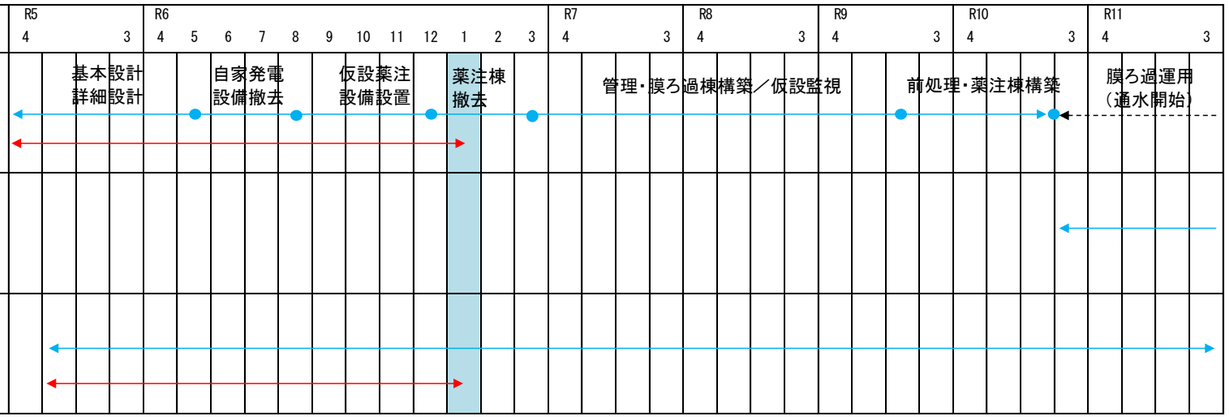

2. 工事状況

基本設計を基に、各種調査を行いながら詳細設計が令和６年５月に完了した。また、その内容照査についても完了した。

今年度は自家発電設備撤去、仮設薬注設備整備及び薬注棟撤去工事、1･2号配水池場内配管整備、配水排泥配管改造を実施する。

【令和７年１月期の主な工事状況】

（１）新しい管理・膜ろ過棟を建築するため、既設機械設備撤去後に薬注棟を解体しており、２月下旬完了を予定している。また、各関係機関との協議および申請は遅滞なく提出しており概ね順調に進んでいる。

①既設薬注棟解体前の写真

令和７年１月15日　撮影

②既設薬注棟解体中の写真

令和７年１月29日　撮影
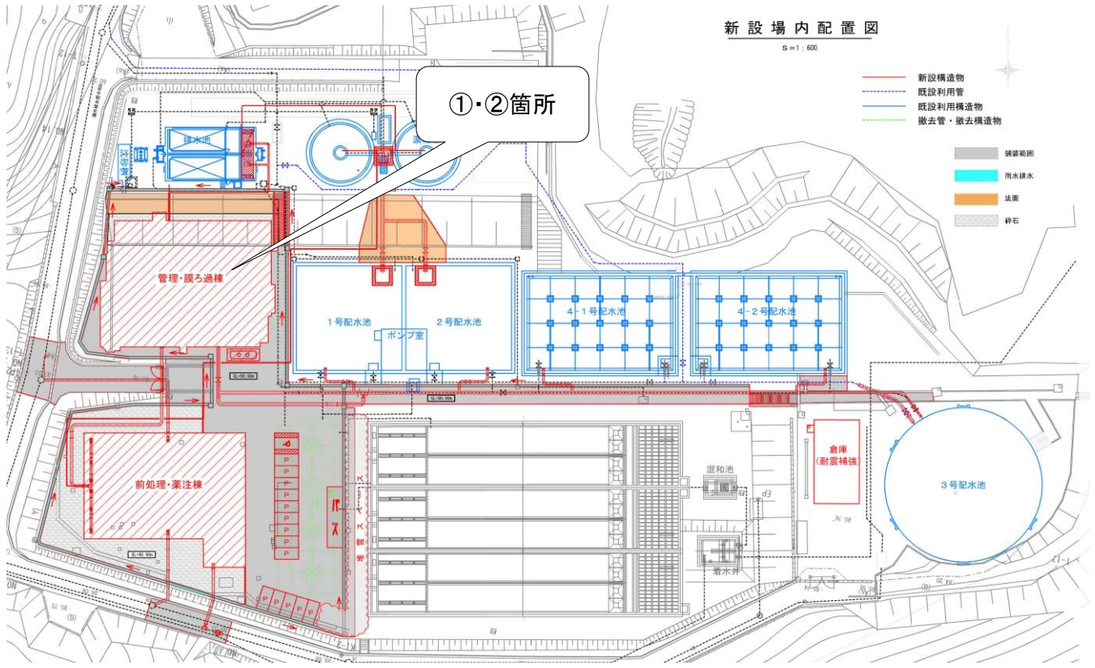
位　置　図
