令和８年１月末現在

令和７年度　保呂羽浄水場再構築事業　進捗状況

凡例
計画
実績

1. 工事等工程および進捗状況

業務名	工　期	請負業者	委託・請負金額（税込）（千円）
登水請第23001-1号 保呂羽浄水場再構築事業 設計及び建設工事	令和５年４月１日～ 令和12年３月31日	メタウォーター・フジタ・只野組・日本水工設計　設計・建設共同企業体	6,763,257 令和7年度事業費 2,008,613
登水管第23010-4号 保呂羽浄水場再構築事業 保全管理業務	通水開始～ 令和31年１月31日	登米ウォーターサービス株式会社	1,470,700
登水委第23009-2号 保呂羽浄水場再構築事業 設計モニタリング及び建設工事 監理支援業務	令和５年７月10日～ 令和12年３月31日	日水コン・楠山設計 共同企業体	209,000 令和7年度事業費 34,020

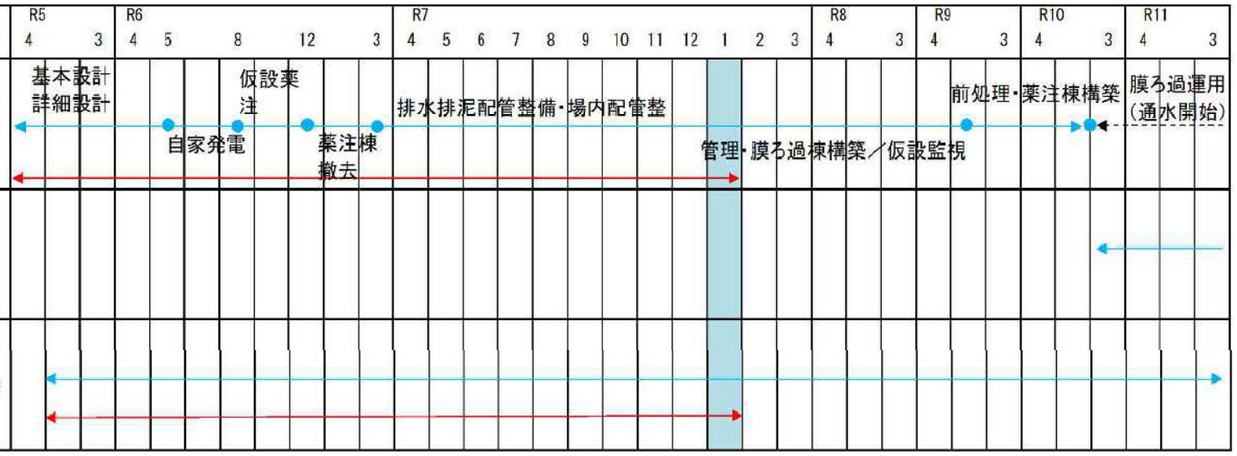

2. 工事状況

今年度は、排水排泥配管の整備と1～4号配水池の場内配管整備及び管理・膜ろ過棟の建設を実施する。

【令和８年１月期の主な工事状況】

（１）管理・膜ろ過棟３階立上り４階床型枠の施工と１号配水池流入管の設置を実施している。

位　置　図

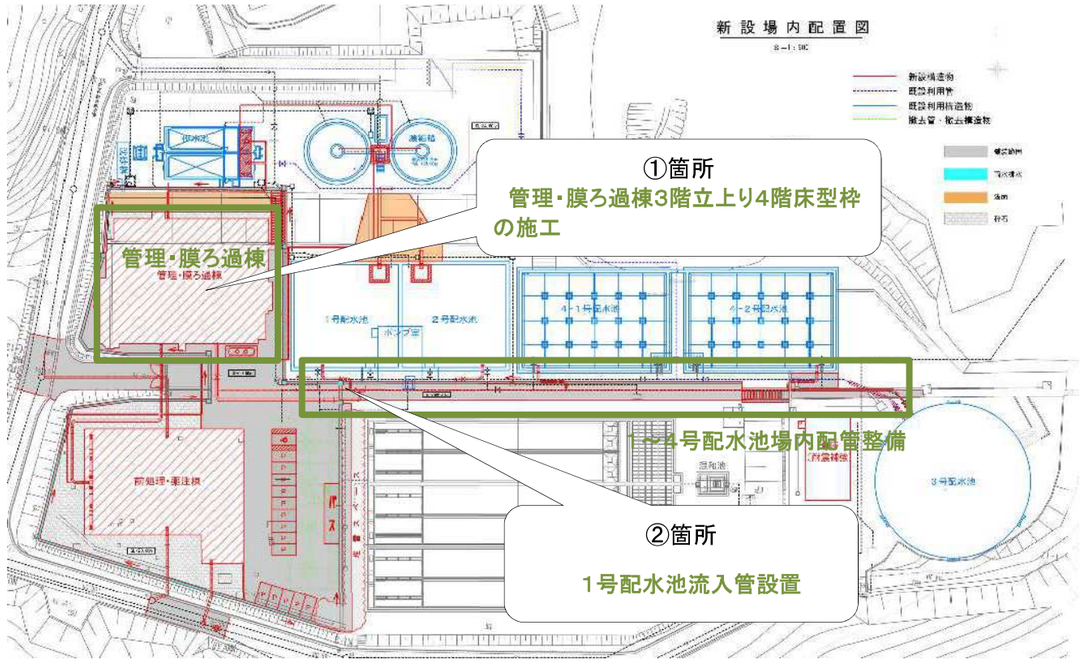

① 管理・膜ろ過棟３階立上り４階床型枠の施工状況

令和８年１月２３日　撮影

② １号配水池流入管の設置状況

令和８年１月３０日　撮影

令和８年２月末現在

令和７年度　保呂羽浄水場再構築事業　進捗状況

凡例
計画
実績

1. 工事等工程および進捗状況

業務名	工　期	請負業者	委託・請負金額（税込）（千円）
登水請第23001-1号 保呂羽浄水場再構築事業 設計及び建設工事	令和５年４月１日～ 令和12年３月31日	メタウォーター・フジタ・只野組・日本水工設計　設計・建設共同企業体	6,763,257 令和7年度事業費 2,008,613
登水管第23010-4号 保呂羽浄水場再構築事業 保全管理業務	通水開始～ 令和31年１月31日	登米ウォーターサービス株式会社	1,470,700
登水委第23009-2号 保呂羽浄水場再構築事業 設計モニタリング及び建設工事 監理支援業務	令和５年７月10日～ 令和12年３月31日	日水コン・楠山設計共同企業体	209,000 令和7年度事業費 34,020

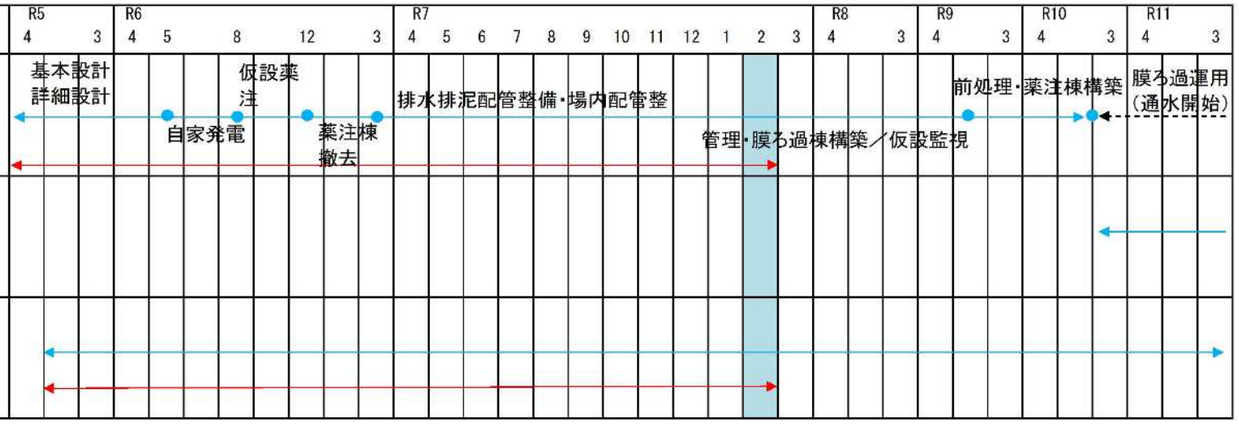

2. 工事状況

今年度は、排水排泥配管の整備と1～4号配水池の場内配管整備及び管理・膜ろ過棟の建設を実施する。

【令和８年２月期の主な工事状況】

（１）管理・膜ろ過棟４階床打設と１号・２号配水池清流壁のコア抜きを実施している。

位　置　図

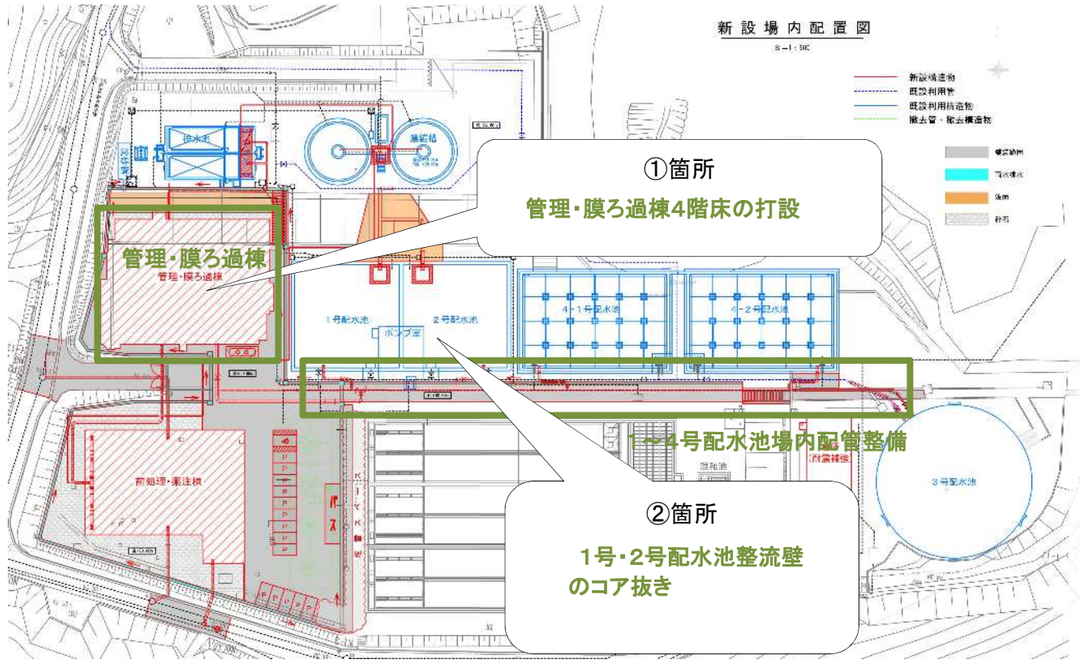

① 管理・膜ろ過棟４階床打設の状況

令和８年２月２５日　撮影

② ２号配水池整流壁のコア抜き状況

令和８年２月２５日　撮影

令和８年３月末現在

令和７年度　保呂羽浄水場再構築事業　進捗状況

凡例
計画
実績

1. 工事等工程および進捗状況

業務名	工　期	請負業者	委託・請負金額（税込）（千円）
登水請第23001-1号 保呂羽浄水場再構築事業 設計及び建設工事	令和５年４月１日～ 令和12年３月31日	メタウォーター・フジタ・只野組・日本水工設計　設計・建設共同企業体	6,763,257 令和7年度事業費 2,008,613
登水管第23010-4号 保呂羽浄水場再構築事業 保全管理業務	通水開始～ 令和31年１月31日	登米ウォーターサービス株式会社	1,470,700
登水委第23009-2号 保呂羽浄水場再構築事業 設計モニタリング及び建設工事 監理支援業務	令和５年７月10日～ 令和12年３月31日	日水コン・楠山設計共同企業体	209,000 令和7年度事業費 34,020

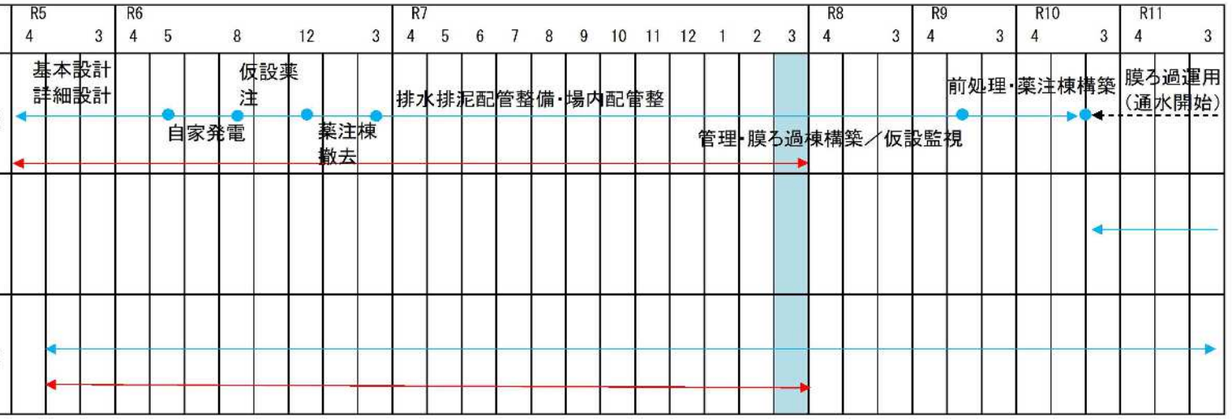

2. 工事状況

今年度は、排水排泥配管の整備と1～4号配水池の場内配管整備及び管理・膜ろ過棟の建設を実施する。

【令和８年３月期の主な工事状況】

（１）管理・膜ろ過棟屋上の打設と１号・２号配水池の配水流出管の布設を実施している。

位　置　図

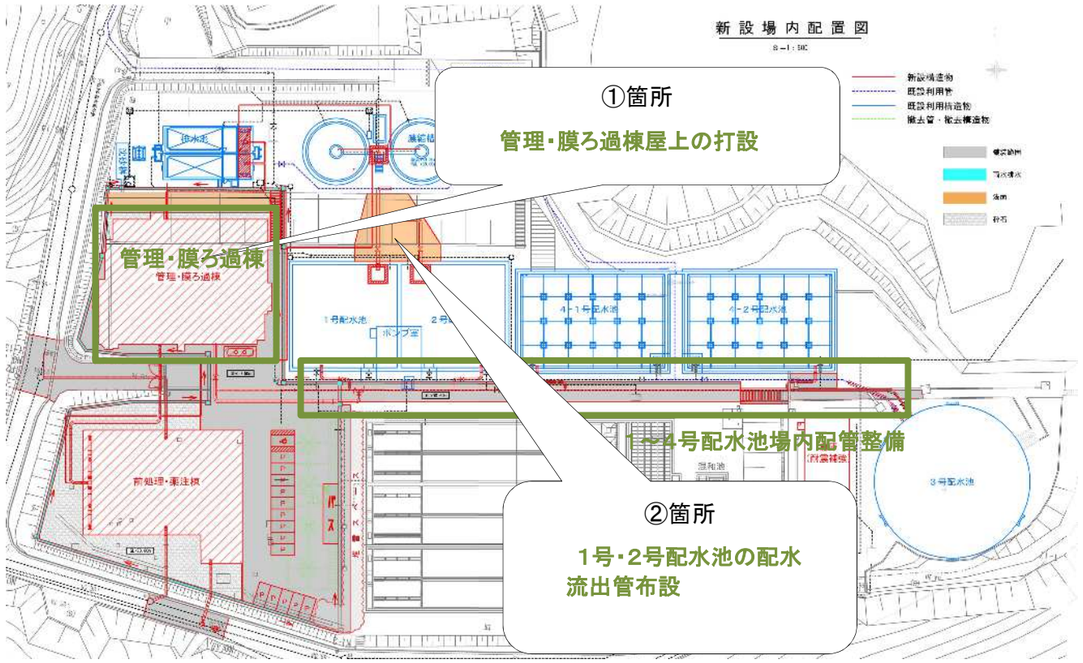

① 管理・膜ろ過棟屋上打設の状況

令和８年３月２７日　撮影

② １・２号配水池の配水流出管布設状況

令和８年３月３０日　撮影
