令和８年４月末現在

# 令和８年度　保呂羽浄水場再構築事業　進捗状況

凡例
計画
実績

## 1. 工事等工程および進捗状況

| 業務名 | 工　期 | 請負業者 | 委託・請負金額（税込）（千円） |
|---|---|---|---|
| 登水請第23001-1号<br>保呂羽浄水場再構築事業<br>設計及び建設工事 | 令和５年４月１日～<br>令和12年３月31日 | メタウォーター・フジタ・只野組・日本水工設計　設計・建設共同企業体 | 7,080,685<br>令和8年度事業費<br>1,661,709 |
| 登水管第23010-4号<br>保呂羽浄水場再構築事業<br>保全管理業務 | 通水開始～<br>令和31年１月31日 | 登米ウォーターサービス株式会社 | 1,470,700 |
| 登水委第23009-2号<br>保呂羽浄水場再構築事業<br>設計モニタリング及び建設工事<br>監理支援業務 | 令和５年７月10日～<br>令和12年３月31日 | 日水コン・楠山設計共同企業体 | 209,000<br>令和8年度事業費<br>34,020 |

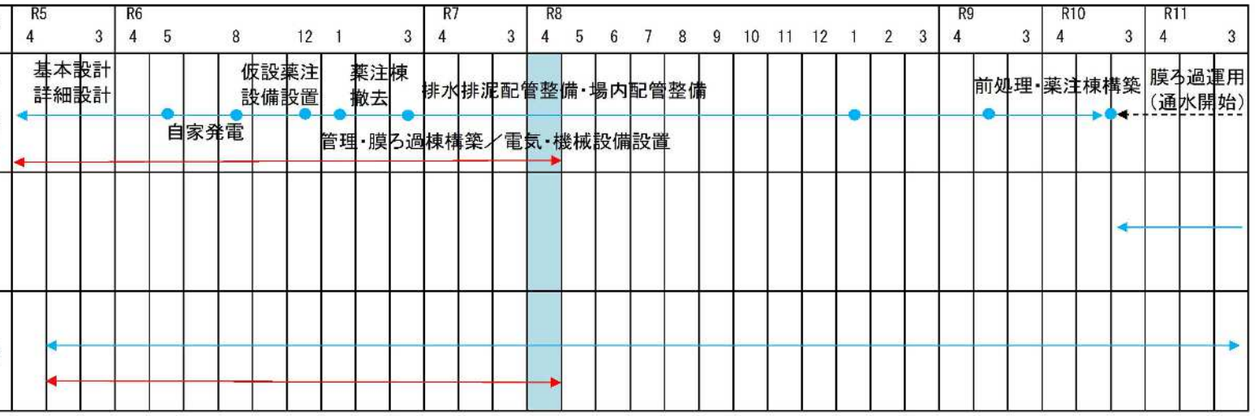


## 2. 工事状況

今年度は、排水排泥配管の整備と場内配管整備、電気・機械設備の設置及び管理・膜ろ過棟の建設を実施する。

【令和８年４月期の主な工事状況】

（１）管理・膜ろ過棟４Ｆ及び屋上のコンクリート工が完了した。また、膜ろ過室の防塵塗装を実施している。

① 管理・膜ろ過棟４Ｆ及び屋上のコンクリート工完了の状況

令和８年４月２７日　撮影

② 膜ろ過室の防塵塗装の状況

令和８年４月２７日　撮影
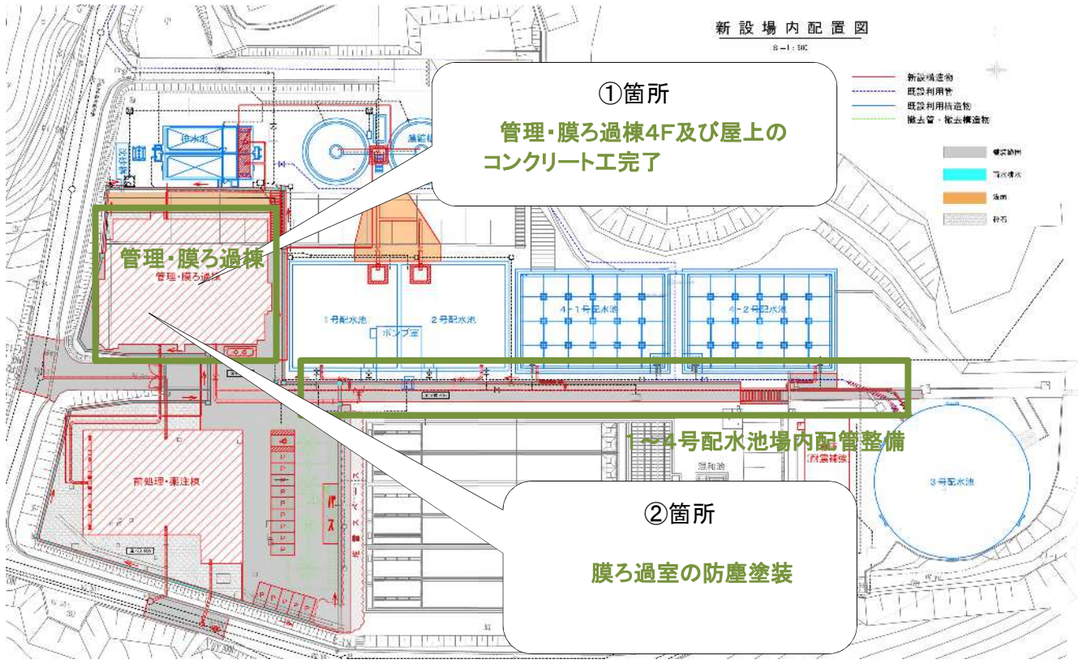
位　置　図
