令和８年５月末現在

令和８年度　保呂羽浄水場再構築事業　進捗状況

凡例
計画
実績

1. 工事等工程および進捗状況

業務名	工　期	請負業者	委託・請負金額（税込）（千円）
登水請第23001-1号 保呂羽浄水場再構築事業 設計及び建設工事	令和５年４月１日～ 令和12年３月31日	メタウォーター・フジタ・只野組・日本水工設計　設計・建設共同企業体	7,080,685 令和8年度事業費 1,661,709
登水管第23010-4号 保呂羽浄水場再構築事業 保全管理業務	通水開始～ 令和31年１月31日	登米ウォーターサービス株式会社	1,470,700
登水委第23009-2号 保呂羽浄水場再構築事業 設計モニタリング及び建設工事 監理支援業務	令和５年７月10日～ 令和12年３月31日	日水コン・楠山設計共同企業体	209,000 令和8年度事業費 34,020

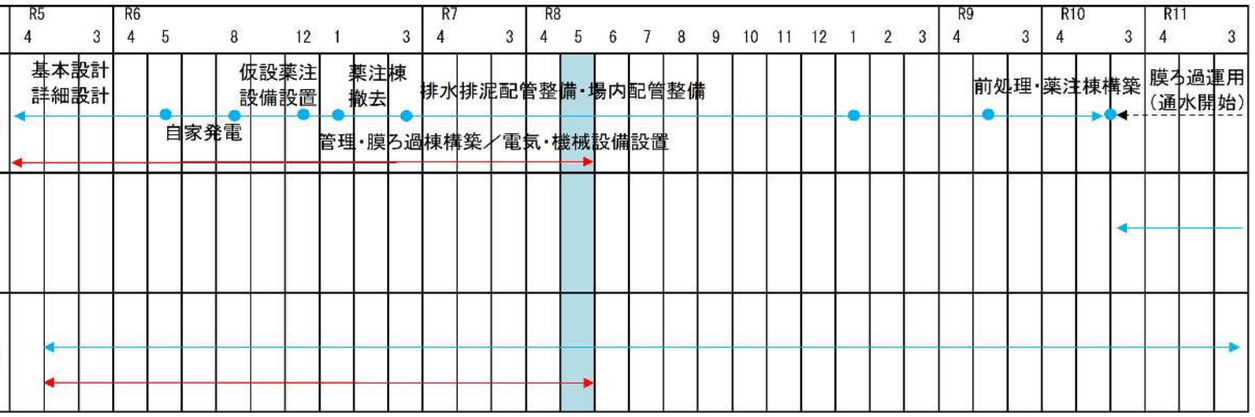

2. 工事状況

今年度は、排水排泥配管の整備と場内配管整備、電気・機械設備の設置及び管理・膜ろ過棟の建設を実施する。

【令和８年５月期の主な工事状況】

（１）管理・膜ろ過棟屋上の防水施工と膜ろ過室の薬品洗浄設備の設置を実施している。

① 管理・膜ろ過棟屋上の防水施工の状況

令和８年５月２９日　撮影

② 膜ろ過室の薬品洗浄設備の設置状況

令和８年５月２７日　撮影
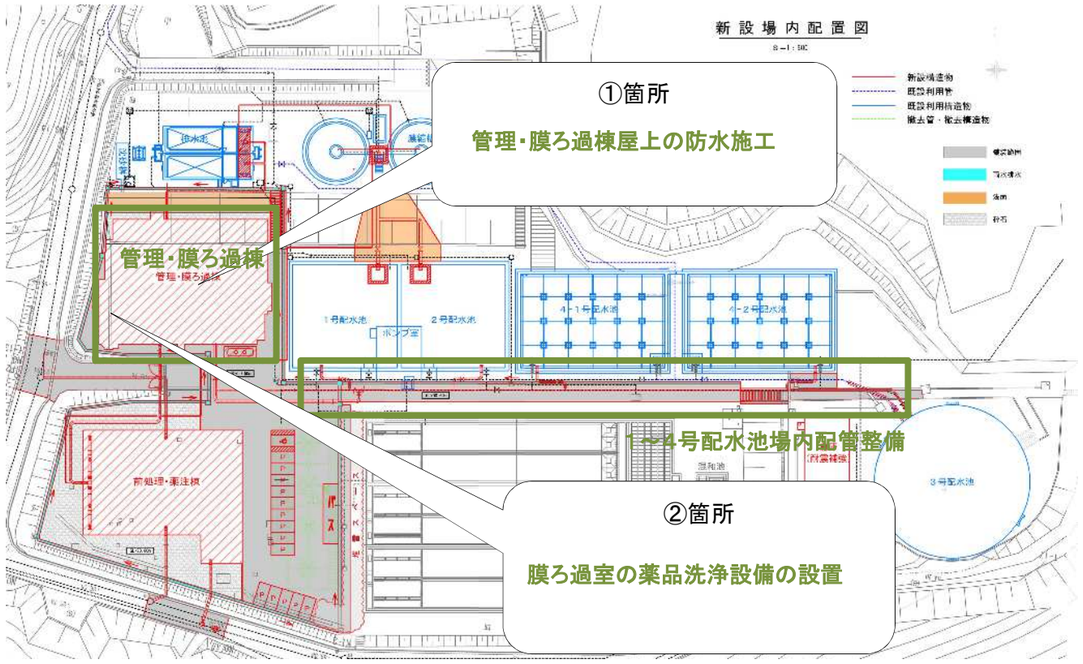
位　置　図
