令和５年５月末現在

令和５年度　保呂羽浄水場再構築事業　進捗状況

凡例
計画
実績

1. 工事等工程および進捗状況

業務名	工　期	請負業者	委託・請負金額（税込）（千円）	進捗
登水請第23001-1号 保呂羽浄水場再構築事業 設計及び建設工事	令和５年４月１日～ 令和12年３月31日	メタウォーター・フジタ・只野組・日本水工設計　設計・建設共同企業体	6,547,200 令和5年度事業費 33,608	基本設計・詳細設計 仮設発注 管理・膜ろ過棟構築／仮設監視 前処理・薬注棟構築 膜ろ過運用（通水開始）
登水管第23010-4号 保呂羽浄水場再構築事業 保全管理業務	通水開始～ 令和31年１月31日	登米ウォーターサービス株式会社	1,470,700	
登水委第23009-2号 登米市保呂羽浄水場再構築事業 設計モニタリング及び建設工事監理支援業務	契約日の翌日～ 令和12年３月31日	－	－	発注準備中

2. 工事状況

令和５年度から令和６年５月にかけて基本設計・詳細設計を実施するにあたり、事前調査として、地質調査、試掘調査及び既設施設調査を行う。

（１）地質調査　　：土層構成や地盤の力学特性の把握、構造物の設計、耐震性評価等を目的として地質調査を実施する。

（２）試掘調査　　：既設の埋設管位置及び埋設物を確認するため、試験掘削を実施する。

（３）既存施設調査：自家発電機棟の継続利用のため、躯体の耐久性確認を目的とし、目視調査及びコンクリート圧縮強度試験を実施する。

既存施設調査
自家発電機棟の目視調査

令和5年5月9日　撮影

既存施設調査
自家発電機棟のコンクリートコア採取

令和5年5月9日　撮影

計　画　平　面　図

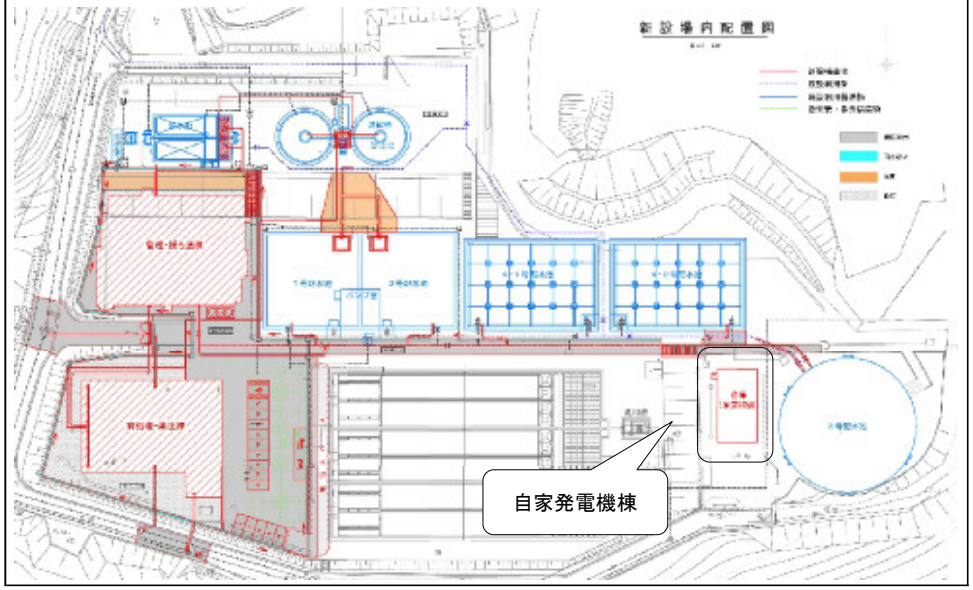

令和５年６月末現在

令和５年度　保呂羽浄水場再構築事業　進捗状況

凡例
計画
実績

1. 工事等工程および進捗状況

業務名	工　期	請負業者	委託・請負金額（税込）（千円）
登水請第23001-1号 保呂羽浄水場再構築事業 設計及び建設工事	令和５年４月１日～ 令和12年３月31日	メタウォーター・フジタ・只野組・日本水工設計　設計・建設共同企業体	6,547,200 令和5年度事業費 33,608
登水管第23010-4号 保呂羽浄水場再構築事業 保全管理業務	通水開始～ 令和31年１月31日	登米ウォーターサービス株式会社	1,470,700
登水委第23009-2号 登米市保呂羽浄水場再構築事業 設計モニタリング及び建設工事監理支援業務	契約日の翌日～ 令和12年３月31日	－	－

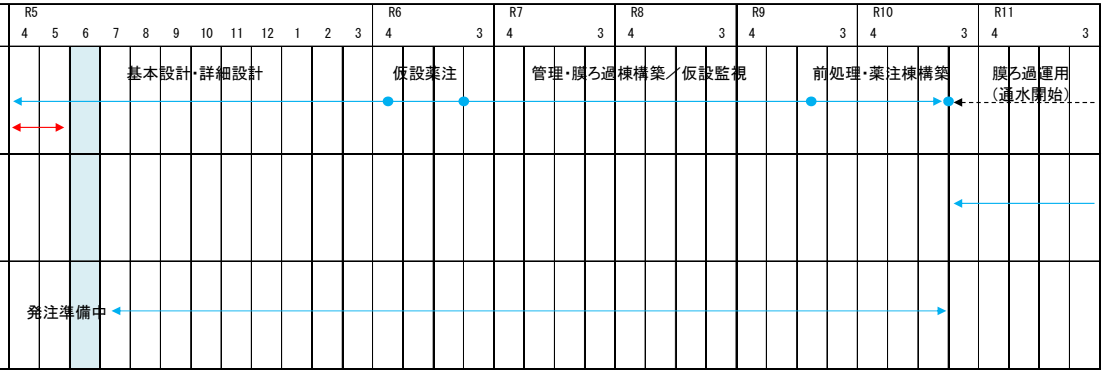

2. 工事状況

令和５年度から令和６年５月にかけて基本設計・詳細設計を実施するにあたり、事前調査として、地質調査、試掘調査及び既設施設調査を行う。

（１）地質調査　　：土層構成や地盤の力学特性の把握、構造物の設計、耐震性評価等を目的として地質調査を実施する。

（２）試掘調査　　：既設の埋設管位置及び埋設物を確認するため、試験掘削を実施する。

（３）既存施設調査：自家発電機棟の継続利用のため、躯体の耐久性確認を目的とし、目視調査及びコンクリート圧縮強度試験を実施する。

地質調査
ボーリング調査の掘進状況

令和5年6月1日　撮影

地質調査
検尺（深度＝10.00m）

令和5年6月2日　撮影
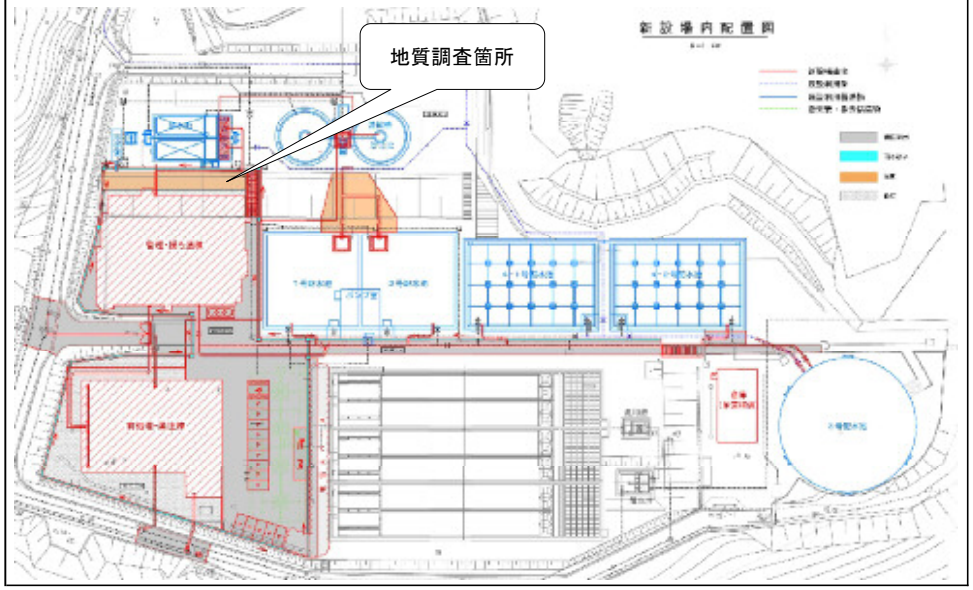
計　画　平　面　図
