令和６年１月末現在

令和５年度　保呂羽浄水場再構築事業　進捗状況

凡例
計画
実績

1. 工事等工程および進捗状況

業務名	工　期	請負業者	委託・請負金額（税込）（千円）
登水請第23001-1号 保呂羽浄水場再構築事業 設計及び建設工事	令和５年４月１日～ 令和12年３月31日	メタウォーター・フジタ・只野組・日本水工設計　設計・建設共同企業体	6,547,200 令和5年度事業費 30,247
登水管第23010-4号 保呂羽浄水場再構築事業 保全管理業務	通水開始～ 令和31年１月31日	登米ウォーターサービス株式会社	1,470,700
登水委第23009-2号 保呂羽浄水場再構築事業 設計モニタリング及び建設工事監理支援業務	令和５年７月10日～ 令和12年３月31日	日水コン・楠山設計共同企業体	209,000 令和5年度事業費 20,900

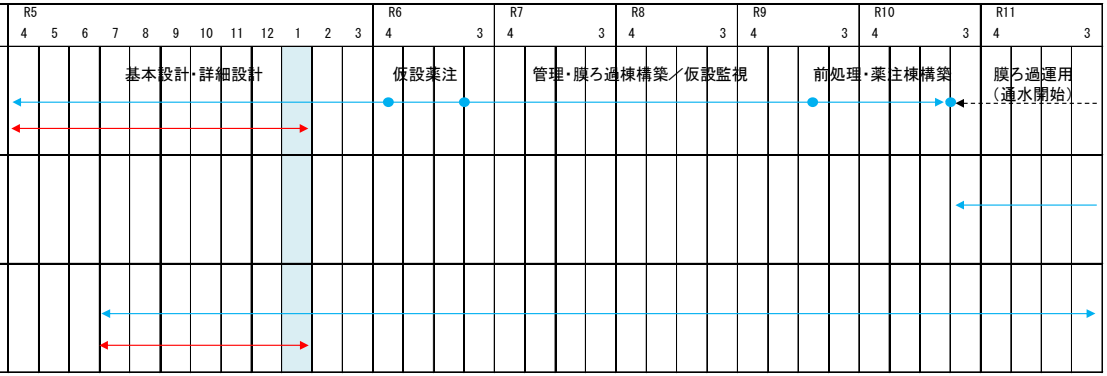

2. 工事状況

今年度、基本設計と詳細設計に着手した。基本設計は、技術提案書や要求水準書等の内容を具現化するための設計業務であり、令和５年７月31日に完了した。

現在は、基本設計を基に、各種調査を行いながら詳細設計を行っており、令和６年５月末完了予定である。

【令和６年１月期の主な工事状況】

（１）移設機器の図面作成を目的として、監視カメラ用制御盤の確認作業を実施した。

①既存現地調査
監視カメラ用制御盤の確認１

令和6年1月15日　撮影

②既存現地調査
監視カメラ用制御盤の確認２

令和6年1月15日　撮影

計　画　平　面　図

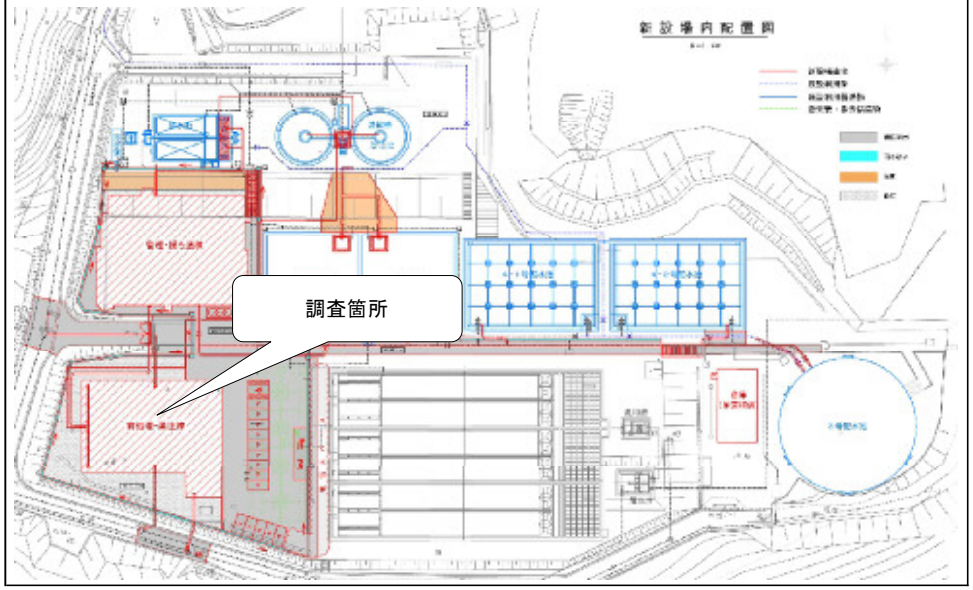

令和６年２月末現在

令和５年度　保呂羽浄水場再構築事業　進捗状況

凡例
計画
実績

1. 工事等工程および進捗状況

業務名	工　期	請負業者	委託・請負金額（税込）（千円）	工程（R5 4～R11 3）
登水請第23001-1号 保呂羽浄水場再構築事業 設計及び建設工事	令和５年４月１日～ 令和12年３月31日	メタウォーター・フジタ・只野組・日本水工設計　設計・建設共同企業体	6,547,200 令和5年度事業費 30,247	基本設計・詳細設計 仮設発注 管理・膜ろ過棟構築／仮設監視 前処理・薬注棟構築 膜ろ過運用（通水開始）
登水管第23010-4号 保呂羽浄水場再構築事業 保全管理業務	通水開始～ 令和31年１月31日	登米ウォーターサービス株式会社	1,470,700	
登水委第23009-2号 保呂羽浄水場再構築事業 設計モニタリング及び建設工事監理支援業務	令和５年７月10日～ 令和12年３月31日	日水コン・楠山設計共同企業体	209,000 令和5年度事業費 20,900	

2. 工事状況

今年度、基本設計と詳細設計に着手した。基本設計は、技術提案書や要求水準書等の内容を具現化するための設計業務であり、令和５年７月31日に完了した。

現在は、基本設計を基に、各種調査を行いながら詳細設計を行っており、令和６年５月末完了予定である。

【令和６年２月期の主な工事状況】

（１）既設自家発電機棟の撤去工事を行うため、現地調査を実施した。

①既存現地調査
自家発電機棟撤去のための現地調査　１

令和6年2月15日　撮影

②既存現地調査
自家発電機棟撤去のための現地調査　２

令和6年2月15日　撮影

計　画　平　面　図

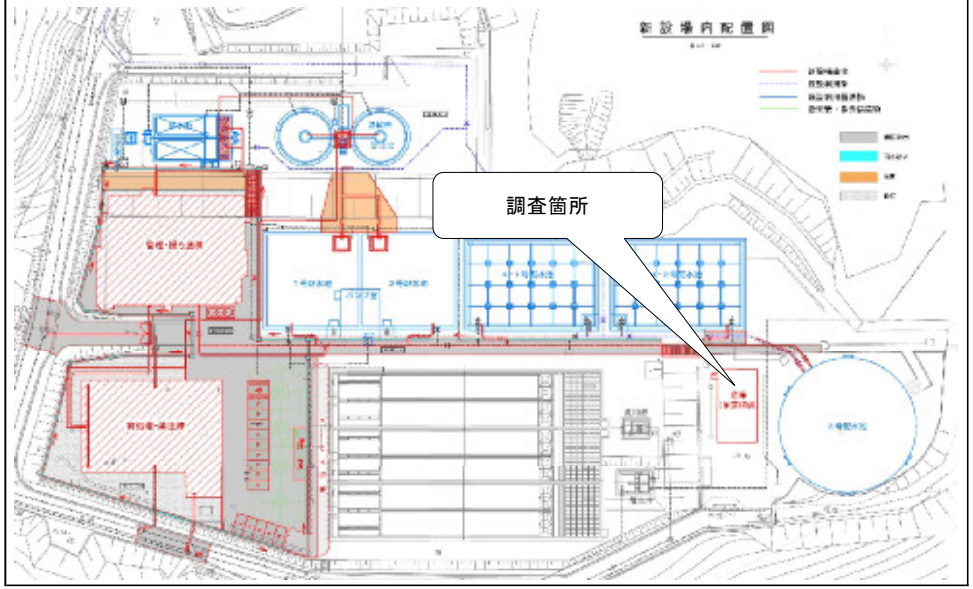

令和６年３月末現在

令和５年度　保呂羽浄水場再構築事業　進捗状況

凡例
計画
実績

1. 工事等工程および進捗状況

業務名	工　期	請負業者	委託・請負金額（税込）（千円）
登水請第23001-1号 保呂羽浄水場再構築事業 設計及び建設工事	令和５年４月１日～ 令和12年３月31日	メタウォーター・フジタ・只野組・日本水工設計　設計・建設共同企業体	6,547,200 令和5年度事業費 30,247
登水管第23010-4号 保呂羽浄水場再構築事業 保全管理業務	通水開始～ 令和31年１月31日	登米ウォーターサービス株式会社	1,470,700
登水委第23009-2号 保呂羽浄水場再構築事業 設計モニタリング及び建設工事監理支援業務	令和５年７月10日～ 令和12年３月31日	日水コン・楠山設計共同企業体	209,000 令和5年度事業費 20,900

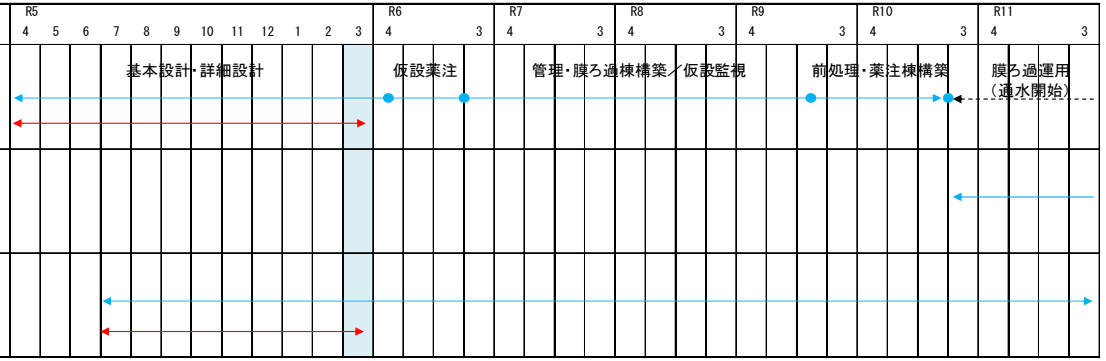

2. 工事状況

今年度、基本設計と詳細設計に着手した。基本設計は、技術提案書や要求水準書等の内容を具現化するための設計業務であり、令和５年７月31日に完了した。

現在は、基本設計を基に、各種調査を行いながら詳細設計を行っており、令和６年５月末完了予定である。

【令和６年３月期の主な工事状況】

（１）登米市登米町小島地内に現場事務所を設置した。

①現場事務所設置
現場事務所の設置状況　１

令和6年3月15日　撮影

②現場事務所設置
現場事務所の設置状況　２

令和6年3月15日　撮影

位　置　図
